

【高伸建設株式会社御中】

AI積算システム
ご提案書

目次

- 0 ご提案サマリー
- 1 与件の整理
- 2 ご提案の全体像
- 3 ご提案詳細
- 4 進め方
- 5 お見積もり

ご提案のサマリー

「積算」を RADIX に並ぶ貴社の競争力へ

2ヶ月で積算の技を AI で再現

5ヶ月で誰でも使えるアプリケーションに

約1年をかけ AI が90%の業務を AI が実行し

積算のスピードと正確性を貴社の新たな競争力にする

SEKISAN AI transformation プロジェクト

与件整理

テーマ	課題	解決の方向性
積算業務の生産性向上	図面や資料を 目視で確認し手入力している ため、単純な拾い出しと転記作業に多くの時間を費やしている。 担当者の作業キャパシティが案件数のボトルネック になっている。	大変な作業をAIで代替し、人間は「確認・判断」という付加価値の高い業務に集中し、スケーリングできるしやすい環境を構築を構築する。
積算精度の向上とリスク低減	目視による確認や手作業での対応により担当者の経験やスキルに依存。ヒューマンエラーが発生する可能性 もあり手戻りやコスト超過の原因となっている。	AIによる標準化された作業でヒューマンエラーを削減。算出根拠も可視化されるためダブルチェックも容易かつ確実に行えるようにする。
業務の属人化解消と技術継承	積算ノウハウが特定のベテラン社員に集中し属人化。 ベテラン社員の退職によるノウハウの喪失リスクや、若手への技術継承が困難 に	ベテランの判断プロセスをAIのルールやデータとして蓄積。システム自体が「動くノウハウ」となり、組織全体のスキルを底上げし、技術継承を促進。

ご提案

積算業務を効率化する「AI積算システム」のご提案

今回のプロジェクトは、PoCによる技術検証から始め、リスクを最小限に抑えつつ段階的にシステムを構築します。このアプローチにより、貴社の業務に確実にフィットする AI基盤を創り上げ、将来の競争力へと繋がります。

AI積算システムにおけるポイント

高精度 AI


- ・図面上の積算範囲を自動で認識
- ・記号・リスト・議事録を統合的に解釈
- ・面倒な「拾い出し」作業からの解放

信頼性 操作性

- ・直感的なUIでAIの解析結果を修正
- ・算出根拠の可視化によるプロセスの透明化
- ・専門家が最終判断する「人とAIの協業」

段階的 導入


- ・PoCによる技術検証でリスクを最小化
- ・必要な機能から導入できる無駄のない投資
- ・将来の機能拡張を見据えたシステム基盤

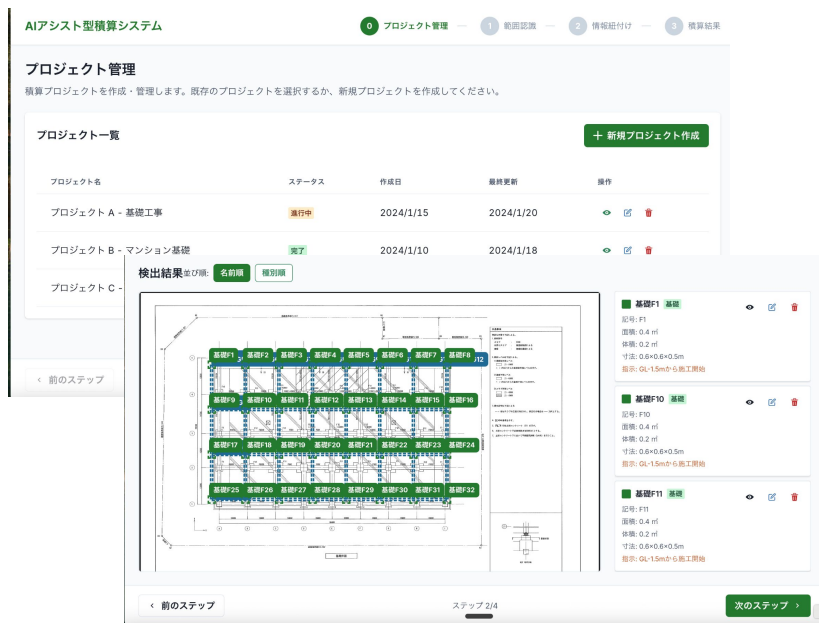

ご提案システムの全体像

構造図/リスト/議事録メモをアップし、数量拾い・積算計算を自動実行

構造図など

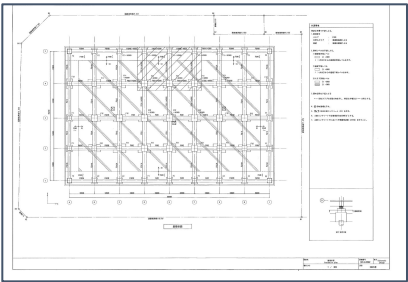

手書きメモ/録音




最新のマルチモーダル AIとLLMを活用し、
図形・テキスト・会話を統合的に解釈。ベテランの思考プロセスを模倣した独自のロジックで数量を自動算出

積算数量集計表									
図 号	〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇				日 付	令和7年4月1日			
図 主					依 頼 日	令和7年4月1日			
図 住 所					依 頼 者 名	〇〇〇			
図 計 画 社					標 識 記	〇〇〇〇			
元 単 位					積 算 基 準	断面内量 20'			
積 算 基 準	断面内量 0.45m				断面内量	20'			
工種	種別	適用	数量	単位	備考				
土木系	基礎	基礎(断面1000×400)	813.88	m ³	21設計(10×0.88m)				
	基礎	基礎(1000×200~2100)	2,822.17	m ³	設計(10×2.41m)				
	基礎	地中壁(1000×200)	3,368.95	m ³					
	基礎	地下埋設管(1000)	0.00	m ³					
	基礎	基礎(1000)	0.00	m ³					
	基礎	基礎(断面1000)	2,162.89	m ³					
	基礎	基礎(断面1000)	588.41	m ³					
	基礎	地中壁(断面1000)	1,100.45	m ³					
	基礎	土間スラブ	3,789.97	m ³					
	基礎	基礎	0.00	m ³					
	基礎	基礎	15.19	m ³	b=0.08				
	基礎	基礎	16.00	m ³	b=0.08				
	基礎	基礎	228.00	m ³	b=0.08				
	基礎	基礎	0.00	m ³	b=0.08				
建築系	柱	PC柱(断面400×400)	88	m					
	柱	H= 0.10	88	米	PC柱	7.77m×7.77m			
	柱	H= 0.10	88	米	PC柱				
	柱	H= 0.10	88	米	PC柱				
	柱	H= 0.10	88	米	PC柱				
	柱	H= 0.10	88	米	PC柱				
	柱	H= 0.10	88	米	PC柱				
	柱	H= 0.10	88	米	PC柱				
	柱	H= 0.10	88	米	PC柱				
	柱	H= 0.10	88	米	PC柱				
	柱	H= 0.10	88	米	PC柱				
	柱	H= 0.10	88	米	PC柱				
	柱	H= 0.10	88	米	PC柱				
	柱	H= 0.10	88	米	PC柱				
	設備系	配管	配管(断面1000)	813.88	m				
配管		配管(断面1000)	2,822.17	m					
配管		配管(断面1000)	3,368.95	m					
配管		配管(断面1000)	0.00	m					
配管		配管(断面1000)	0.00	m					
配管		配管(断面1000)	2,162.89	m					
配管		配管(断面1000)	588.41	m					
配管		配管(断面1000)	1,100.45	m					
配管		配管(断面1000)	3,789.97	m					
配管		配管(断面1000)	0.00	m					
配管		配管(断面1000)	15.19	m					
配管		配管(断面1000)	16.00	m					
配管		配管(断面1000)	228.00	m					
配管		配管(断面1000)	0.00	m					
配管		配管(断面1000)	0.00	m					

機能の詳細①：図面解析・範囲認識機能

AIが図面から積算範囲を自動で拾い出し、拾い漏れを防ぐことで
担当者の作業負担と手戻りを大幅に削減。

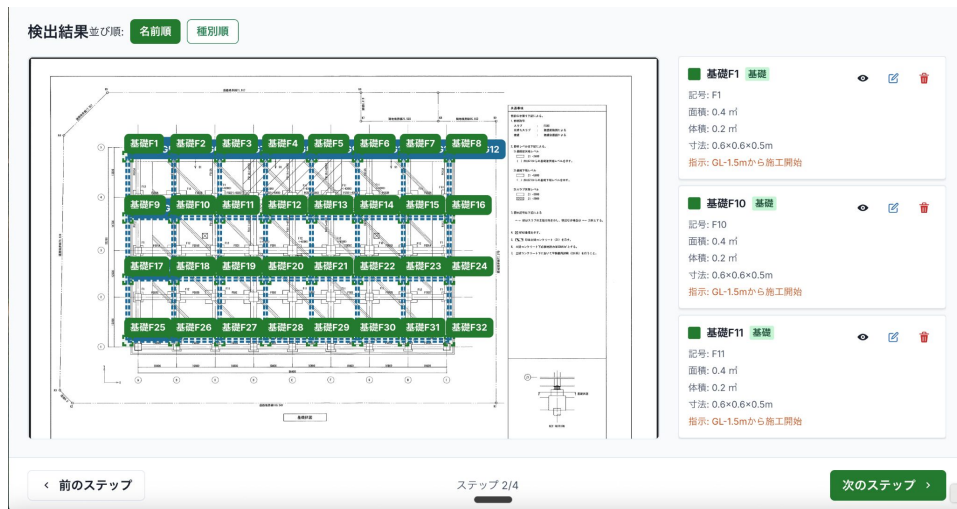

PDF形式の構造
図から積算範囲
を自動で抽出

AIが認識した範
囲を色分けや枠
線で分かりやす
く可視化

マウス操作で認
識範囲の追加・
形状調整・削除
が直感的に可能

人間が最終承認
することで、拾
い出しの正確性
を担保

機能の詳細②：情報自動紐付け機能

AIが図面とメモから数値を自動で転記・紐付け、
転記ミスや誤認識をなくし、計算のインプット精度を担保

ステップ2: 情報紐付け

検出された範囲に対し、寸法情報や特別指示を紐付けます。関連資料をアップロードしてAIによる自動紐付けを実行するか、手動で情報を編集してください。

関連資料のアップロード

基礎・量リスト（寸法表）

寸法表をアップロード

対応形式: JPEG, PNG, PDF

ファイルを選択

デバッグ: シンプルなファイル選択

打ち合わせメモ・特別指示

メモをアップロード

対応形式: JPEG, PNG, PDF

ファイルを選択

デバッグ: シンプルなファイル選択

+ AIによる自動紐付けを実行

検出範囲と紐付け情報

範囲名	種類	記号	寸法 (L×W×H)	特別指示	操作
■ 地中梁G1	[検字表]	G1	35×0.4×0.8m	型枠高さ2.8mまで	👁️ 🔗
■ 地中梁G2	[検字表]	G2	35×0.4×0.8m	型枠高さ2.8mまで	👁️ 🔗
■ 地中梁G3	[検字表]	G3	35×0.4×0.8m	型枠高さ2.8mまで	👁️ 🔗
■ 地中梁G4	[検字表]	G4	35×0.4×0.8m	型枠高さ2.8mまで	👁️ 🔗
■ 地中梁G5	[検字表]	G5	24×0.4×0.8m	型枠高さ2.8mまで	👁️ 🔗
■ 地中梁G6	[検字表]	G6	24×0.4×0.8m	型枠高さ2.8mまで	👁️ 🔗
■ 地中梁G7	[検字表]	G7	24×0.4×0.8m	型枠高さ2.8mまで	👁️ 🔗
■ 地中梁G8	[検字表]	G8	24×0.4×0.8m	型枠高さ2.8mまで	👁️ 🔗
■ 地中梁G9	[検字表]	G9	24×0.4×0.8m	型枠高さ2.8mまで	👁️ 🔗
■ 地中梁G10	[検字表]	G10	24×0.4×0.8m	型枠高さ2.8mまで	👁️ 🔗

◀ 前のステップ

ステップ 3/4

次のステップ ▶

OCR技術で図面
内の記号や寸法
リストを自動で
読み取り。

LLMが議事録や
メモを解釈し、
特別な指示を抽
出して関連付け

各範囲に紐付い
た情報をポップ
アップで確認
し、簡単に修正
可能

人間がインプ
ット情報を確定さ
せることで、計
算の信頼性を向
上

機能の詳細③：自動計算とアウトプット機能

数量計算を瞬時に自動化し、計算根拠もワンクリックで可視化。
確認作業の時間を短縮し、業務全体のスピードを向上

[illegible]

型枠面積や掘削・埋戻し体積などをリアルタイムで自動計算

計算結果の根拠
を図面上でハイ
ライト表示し、
プロセスの透明
性を確保

最終的な積算結果をワンクリックで使い慣れたExcelや希望のPDF形式で出力可能

違和感があれば、いつでも前のステップに戻って修正・再計算が可能

機能の詳細④：誰でも簡単に使えるUI/UX

AIの解析結果を画面を見てマウスで直すだけの簡単操作。専門スキルが不要で、誰でもすぐに使いこなせ、業務の属人化を解消

AIアシスト型積算システム

プロジェクト管理 — 範囲認識 — 情報紐付け — 3 積算結果

ステップ3: 積算結果

設定された範囲と寸法情報に基づいて、型枠面積と土工事体積を自動計算します。結果をプレビューで確認し、Excelファイルとしてエクスポートできます。

積算計算の実行

設定された情報に基づいて数量を自動計算します

積算を実行

型枠工事
577.3 m²
44箇所合計

掘削工事
112.0 m³
44箇所合計

埋戻し工事
89.6 m³
44箇所合計

プロジェクト管理

積算プロジェクトを作成・管理します。既存のプロジェクトを選択するか、新規プロジェクトを作成してください。

プロジェクト一覧

+ 新規プロジェクト作成

プロジェクト名	ステータス	作成日	最終更新	操作
プロジェクト A - 基礎工事	進行中	2024/1/15	2024/1/20	👁️ 📄 🗑️
プロジェクト B - マンション基礎	完了	2024/1/10	2024/1/18	👁️ 📄 🗑️
プロジェクト C - 戸建基礎	下書き	2024/1/22	2024/1/22	👁️ 📄 🗑️

AIの提案を図面上に直接可視化し、人間は確認と修正に集中できる

マウスのドラッグ&ドロップで直感的に操作できる

トレーニング不要で、導入したその日からすぐに使えるシンプルさを追求

AIの判断プロセスを可視化することで、ブラックボックス化を防ぎ、安心して利用可能

導入フローの工夫

リスクを最小限に抑えながら、最大の効果を出すための
段階的な導入フローのご提案をいたします。

4

自己学習モデル導入

システム自体が使い続けるほど賢くなる自己学習機能を実装。将来の未知パターンにも自律対応。

3

拡張モデル導入

より複雑な形状や異なるフォーマットの図面にも対応。積算業務の自動化率をさらに向上。

2

標準モデル導入

最も頻度の高い標準パターンの図面を解析できる完成品のWebアプリケーションを納品。

1

PoCパッケージ

貴社データでのコア技術の精度を実証。最も使いやすい操作画面のプロトタイプを共同開発。

確実に積算の技術を AIで再現するために「技術検証」を行います。(詳細は次ページにて解説)

フェーズ1 のPoCで行う内容

リスクを抑えながら確実に成果を出すために 事前に設定した項目の検証と評価を行います。

AIによる核算業務を再現するための技術要素と検証計画

核算業務の自動化は、複数のAI技術を適切に組み合わせ、各タスクを連携させることで実現します。以下に、その全工程を「タスク（何をすべきか）」という目的ベースで分解し、それらに必要となる主要技術と、その実現性を確認するための具体的な検証計画を明記します。

フェーズ1：図面情報のデジタル化と要素認識

目的：PDFという「画像とテキストの集合体」から、後続処理で利用可能な最小単位の要素（テキスト、図形）を遅延なく抽出する。

タスク（目的）	主要技術（手段）	検証すべきポイント	検証の仕方（具体的なステップ）
1.A. テキスト情報の抽出と正規化 図面上のすべての文字（部、呼称、数量、寸法などの項目）を、位置情報と共にテキストデータとして抽出する。	画像OCR（文字認識） 光学文字認識（OCR） 図面特有のレイアウトを認識するアルゴリズム（例：行、列、注釈の区別）	図面情報ごとに含まれるテキストの抽出率、抽出精度、抽出後のテキストの正確さ、抽出後のテキストのフォーマット（行、列、注釈の区別）	1. OCR（Optical Character Recognition）を用いて図面からテキストを抽出する。 2. OCRの結果を確認し、抽出されたテキストの正確さを検証する。 3. OCRの結果を確認し、抽出されたテキストのフォーマット（行、列、注釈の区別）を確認する。
2.A. 図面要素間の関係性認識 「この図形はここにある」という関係性を認識する。 図面上の要素（部、呼称、数量、寸法）の位置関係を認識する。 図面上の要素（部、呼称、数量、寸法）の位置関係を認識する。	図面要素間の関係性認識 図面要素間の関係性認識 図面要素間の関係性認識	図面要素間の関係性認識の精度、図面要素間の関係性認識の精度、図面要素間の関係性認識の精度	1. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。 2. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。 3. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。
3.A. 図面情報の抽出とセグメンテーション 図面上のすべての図形（円、直線、角、寸法線など）を抽出し、位置情報と共にテキストデータとして抽出する。	図面要素間の関係性認識 図面要素間の関係性認識 図面要素間の関係性認識	図面要素間の関係性認識の精度、図面要素間の関係性認識の精度、図面要素間の関係性認識の精度	1. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。 2. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。 3. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。
4.A. 図面情報の抽出とセグメンテーション 図面上のすべての図形（円、直線、角、寸法線など）を抽出し、位置情報と共にテキストデータとして抽出する。	図面要素間の関係性認識 図面要素間の関係性認識 図面要素間の関係性認識	図面要素間の関係性認識の精度、図面要素間の関係性認識の精度、図面要素間の関係性認識の精度	1. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。 2. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。 3. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。

技術検証レポート:

https://page.gensparksite.com/docs_agent/e2da7556-e6da4ff8-832f-0b472adada5b/60251366-5fb7-410b-89f4-a3b44011f215/ef34bf47-05cc-4994-ad57-401d830e64a1.html

フェーズ2：関係性の理解と情報の構造化

目的：フェーズ1で抽出されたバラバラの要素群（テキスト、図形）を意味のある情報として関連付け、計算可能な形式にまとめる。

タスク（目的）	主要技術（手段）	検証すべきポイント	検証の仕方（具体的なステップ）
2.A. 図面要素間の関係性認識 「この図形はここにある」という関係性を認識する。 図面上の要素（部、呼称、数量、寸法）の位置関係を認識する。 図面上の要素（部、呼称、数量、寸法）の位置関係を認識する。	マルチモーダルAI (Multimodal AI) (Visual Language Model)	テキストと図形の位置関係や文脈を統合的に理解し、引き出し、関係性にある要素や、離れた場所にある要素と関係を正しく関連付けられるか。	1. プロントエンジニアリングによる検証 関係性や文脈を表現するマルチモーダルAIに対し、図面情報とOCRテキストを同時に入力し、「関係性の図形」や「関係する要素の位置」などのプロンプトで指示し、期待する関係性を評価します。 2. Few-shotプロンプトエンジニアリング 期待する関係性がない場合、プロンプト内いくつかの例（Few-shot）を含めることで、AIに期待する関係性を学習させる。学習例を増やすことで、期待する関係性を評価します。
2.B. 図面要素間の関係性認識 「この図形はここにある」という関係性を認識する。 図面上の要素（部、呼称、数量、寸法）の位置関係を認識する。 図面上の要素（部、呼称、数量、寸法）の位置関係を認識する。	図面要素間の関係性認識 図面要素間の関係性認識 図面要素間の関係性認識	図面要素間の関係性認識の精度、図面要素間の関係性認識の精度、図面要素間の関係性認識の精度	1. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。 2. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。 3. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。
2.C. 図面要素間の関係性認識 「この図形はここにある」という関係性を認識する。 図面上の要素（部、呼称、数量、寸法）の位置関係を認識する。 図面上の要素（部、呼称、数量、寸法）の位置関係を認識する。	図面要素間の関係性認識 図面要素間の関係性認識 図面要素間の関係性認識	図面要素間の関係性認識の精度、図面要素間の関係性認識の精度、図面要素間の関係性認識の精度	1. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。 2. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。 3. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。
2.D. 図面要素間の関係性認識 「この図形はここにある」という関係性を認識する。 図面上の要素（部、呼称、数量、寸法）の位置関係を認識する。 図面上の要素（部、呼称、数量、寸法）の位置関係を認識する。	図面要素間の関係性認識 図面要素間の関係性認識 図面要素間の関係性認識	図面要素間の関係性認識の精度、図面要素間の関係性認識の精度、図面要素間の関係性認識の精度	1. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。 2. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。 3. 図面要素間の関係性認識の精度を確認する。

フェーズ3：数量計算の実行

目的：構造化された情報に基づき、定義された計算ロジックを正確に実行する。

タスク（目的）	主要技術（手段）	検証すべきポイント	検証の仕方（具体的なステップ）
3.A. 計算ロジックの適用と実行 構造化されたデータに対し、「型相合性・長さ×高さ」といった計算式を適用し、全体の数量を算出する。	ルールベースエンジン	フェーズ2で抽出されたレイアウト条件（例：型相合性・長さ×高さ）を500個程度を、基本ロジックに正しく反映させた上で計算を実行できるか。	1. 単体テストの実装 各計算ロジックに対し、入力値と期待される出力値を設定したテストコードを作成します。 2. 複合テストとエンゲージメント
3.B. 計算ロジックの適用と実行 構造化されたデータに対し、「型相合性・長さ×高さ」といった計算式を適用し、全体の数量を算出する。	ルールベースエンジン	フェーズ2で抽出されたレイアウト条件（例：型相合性・長さ×高さ）を500個程度を、基本ロジックに正しく反映させた上で計算を実行できるか。	1. 単体テストの実装 各計算ロジックに対し、入力値と期待される出力値を設定したテストコードを作成します。 2. 複合テストとエンゲージメント
3.C. 計算ロジックの適用と実行 構造化されたデータに対し、「型相合性・長さ×高さ」といった計算式を適用し、全体の数量を算出する。	ルールベースエンジン	フェーズ2で抽出されたレイアウト条件（例：型相合性・長さ×高さ）を500個程度を、基本ロジックに正しく反映させた上で計算を実行できるか。	1. 単体テストの実装 各計算ロジックに対し、入力値と期待される出力値を設定したテストコードを作成します。 2. 複合テストとエンゲージメント

フェーズ4：結果の生成とインタラクティブな検証

目的：計算結果を人間が利用・検証しやすい形で提供し、システムの透明性と信頼性を確保する。

タスク（目的）	主要技術（手段）	検証すべきポイント	検証の仕方（具体的なステップ）
4.A. 結果の生成と検証 計算結果を生成したフォーマット（例：JSON）で出力する。	結果生成ライブラリ (JSON)	計算結果の生成精度、計算結果の生成精度、計算結果の生成精度	1. 単体テストの実装 各計算ロジックに対し、入力値と期待される出力値を設定したテストコードを作成します。 2. 複合テストとエンゲージメント
4.B. 結果の生成と検証 計算結果を生成したフォーマット（例：JSON）で出力する。	結果生成ライブラリ (JSON)	計算結果の生成精度、計算結果の生成精度、計算結果の生成精度	1. 単体テストの実装 各計算ロジックに対し、入力値と期待される出力値を設定したテストコードを作成します。 2. 複合テストとエンゲージメント
4.C. 結果の生成と検証 計算結果を生成したフォーマット（例：JSON）で出力する。	結果生成ライブラリ (JSON)	計算結果の生成精度、計算結果の生成精度、計算結果の生成精度	1. 単体テストの実装 各計算ロジックに対し、入力値と期待される出力値を設定したテストコードを作成します。 2. 複合テストとエンゲージメント
4.D. 結果の生成と検証 計算結果を生成したフォーマット（例：JSON）で出力する。	結果生成ライブラリ (JSON)	計算結果の生成精度、計算結果の生成精度、計算結果の生成精度	1. 単体テストの実装 各計算ロジックに対し、入力値と期待される出力値を設定したテストコードを作成します。 2. 複合テストとエンゲージメント

スケジュール

2ヶ月で技術検証を完了させ、次フェーズに進むためのスケジュール

タスク	担当	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週
1. プロジェクト準備・計画									
1.1 キックオフミーティング	貴社/弊社	■							
1.2 データ授受・環境準備	貴社/弊社	■	■						
1.3 成果指標(KPI)定義ワークショップ	貴社/弊社		■						
2. 【技術検証】要素認識 (フェーズ1)									
2.1 テキスト抽出(OCR)検証 (1-A)	弊社		■	■					
2.2 図形抽出(画像認識)検証 (1-B)	弊社		■	■					
3. 【技術検証】関係性理解 (フェーズ2)									
3.1 関係性推論(マルチモーダルAI)検証 (2-A)	弊社				■	■			
3.2 外部指示解釈(LLM)検証 (2-B)	弊社				■	■			
中間報告会	貴社/弊社					▲			
4. 【統合検証】プロトタイピング (フェーズ4)									
4.1 UI/UXプロトタイプ作成 (4-B)	弊社					■	■		
4.2 ユーザーレビュー&フィードバック収集 (4-B)	貴社/弊社							■	
4.3 プロトタイプへのフィードバック反映	弊社								■
5. プロジェクト完了									
5.1 検証結果レポート作成	弊社							■	■
5.2 最終報告会	貴社/弊社								●

凡例:

■ ■: タスク実施期間 ▲ ▲: 中間報告会（マイルストーン） ● ●: 最終報告会（PoC完了）

PoCプロジェクト費用

お見積もり金額 (PoCプロジェクト一式)

¥4,500,000

(税別)

補足事項

- 本見積もりは、ご提示した PoCスコープを前提としています。
- クラウドインフラ利用料 (Google Cloud Platform等) は別途実費精算とさせていただきます。
- PoC後の保守・運用費用については、別途ご相談の上、お見積もりいたします。

人員	役割	単価(月額)	7月	8月	9月	10月	合計工数	合計金額(税別)
プロジェクトマネージャー	全体統括、要件定義、品質管理	150万円	0.3人月	0.2人月	0.2人月	0.3人月	1.0人月	1,500,000円
AI駆動開発エンジニア	設計、開発、テスト、技術支援	120万円	0.6人月	0.8人月	0.7人月	0.4人月	2.5人月	3,000,000円
月次合計金額(税別)			117万円	126万円	114万円	93万円		4,500,000円

第二フェーズ以降も含めたお見積もり

導入プラン	提供価値	期間（目安）	ご提供価格（税抜）
PoCパッケージ （技術検証）	【実現可能性を証明する】 - 貴社データでのコア技術の精度を実証 - 最も使いやすい操作画面のプロトタイプを共同開発 - 納品物：精度検証レポート、UIプロトタイプ	 約2ヶ月	¥4,500,000
標準モデル開発 （基盤システム）	【主要業務を自動化する】 - 最も頻度の高い標準パターンの図面を解析できる完成品のWebアプリケーションを納品 - 日々の積算業務の効率化をすぐに実感できる	 約3ヶ月	¥9,000,000
拡張モデル開発 （オプション）	【対応範囲を拡大する】 - 標準モデルをアップグレードし、より複雑な形状や異なるフォーマットの図面にも対応 - 積算業務の自動化率をさらに向上	 約3ヶ月	¥9,000,000
自己学習モデル開発 （オプション）	【システムを成長させる】 - ユーザーの修正操作をAIが学習し、使えば使うほど賢くなる自己学習機能を実装 - 将来の未知のパターンにも自律的に対応	 約3ヶ月	¥9,000,000

ご提案のサマリー

「積算」を RADIX に並ぶ貴社の競争力へ

2ヶ月で積算の技を AI で再現

5ヶ月で誰でも使えるアプリケーションに

約1年をかけ AI が90%の業務を AI が実行し

積算のスピードと正確性を貴社の新たな競争力にする

SEKISAN AI transformation プロジェクト
